

Atenea Planificación y seguimiento de proyectos de TI

De herramienta interna a estándar de reporte gerencial:
cómo el área de TI de HIR Seguros da seguimiento a
proyectos, tareas y avance con Atenea.

¿Qué es Atenea y para qué se usa hoy?

Atenea nació como un proyecto propio y, más de 6 meses después, sigue en uso activo en el área de TI de HIR Seguros para planificar y dar seguimiento a sus proyectos internos. No es solo un tablero de tareas: es la fuente que el equipo usa para llegar a reuniones a nivel gerencial con datos concretos — cuánto se lleva de avance, qué tan cerca está la fecha estimada de cierre, y dónde está la carga de trabajo.

ANTES • SEGUIMIENTO DISPERSO

- Avance de proyectos sin una fuente única y confiable.
- Reportar a gerencia dependía de armar el estatus manualmente.
- Difícil saber, de un vistazo, si un proyecto va atrasado.
- Sin bitácora de qué cambió y cuándo en cada tarea.

AHORA • CON ATENEA


- Proyectos con tareas, horas estimadas/reales y % de avance en vivo.
- Módulo de Métricas listo para presentar en junta gerencial.
- Tasa de retraso y horas totales calculadas automáticamente.
- Histórico de cambios por tarea, con fecha y responsable.

Estructura de la plataforma

Todo se organiza en 5 secciones desde el menú lateral: **Tareas**, **Proyectos**, **Calendario**, **Métricas** e **Histórico**. Los proyectos agrupan tareas; las tareas se muestran en un tablero tipo Kanban y también en el calendario por fecha; y tanto Métricas como Histórico leen esos mismos datos para reportar avance y auditar cambios.

El proyecto como unidad de trabajo


Cada proyecto (ej. "Aplicación de Retenedor", "Cierre contabilidad", "Integración salesforce") se muestra como una tarjeta con tres números clave — tareas totales, tareas hechas y horas extra — más una barra de progreso. Al abrir el detalle se ve además la descripción del proyecto.




Vista general de proyectos activos, con progreso y horas por tarjeta.

Activos vs. Finalizados

La pestaña "Activos" agrupa lo que sigue en curso; "Finalizados" muestra los proyectos ya cerrados, cada uno con su fecha de finalización y el progreso final registrado. Esta separación es lo que le permite al equipo, en una reunión, distinguir rápido qué se entregó y qué sigue en marcha.




Pestaña "Finalizados": proyectos cerrados con fecha de cierre y progreso final.

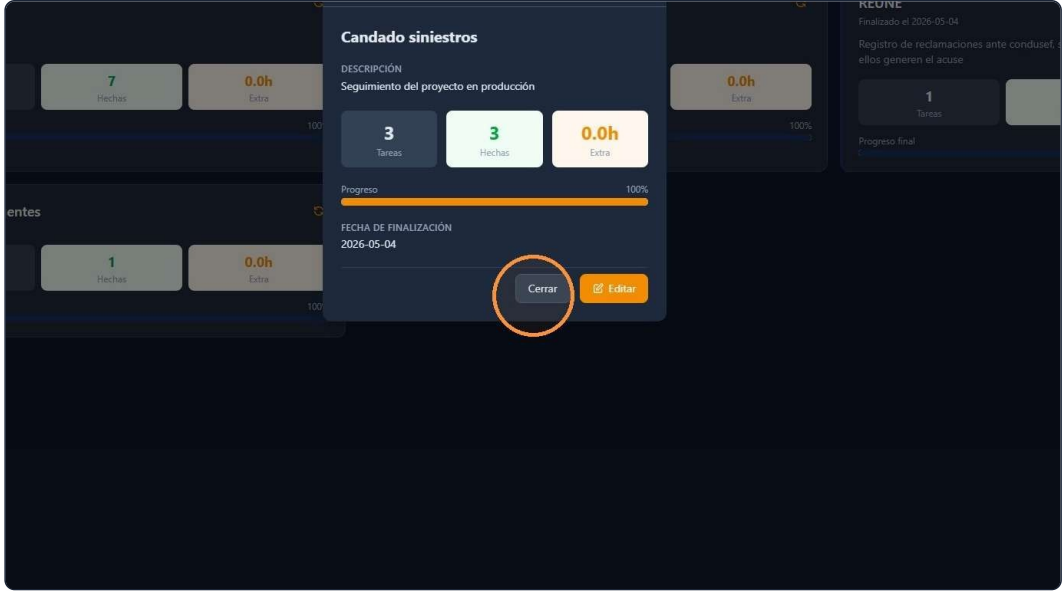

Detalle de un proyecto finalizado: descripción, tareas, horas y fecha de finalización.

Tablero de tareas (Kanban)

Cada tarea vive en una de cuatro columnas — **Pendiente**, **En desarrollo**, **Pruebas**, **Hecho** — y puede filtrarse por proyecto, estado, miembro del equipo y rango de fechas. Arriba del tablero se ven contadores en vivo: completadas, con retraso y vencidas.

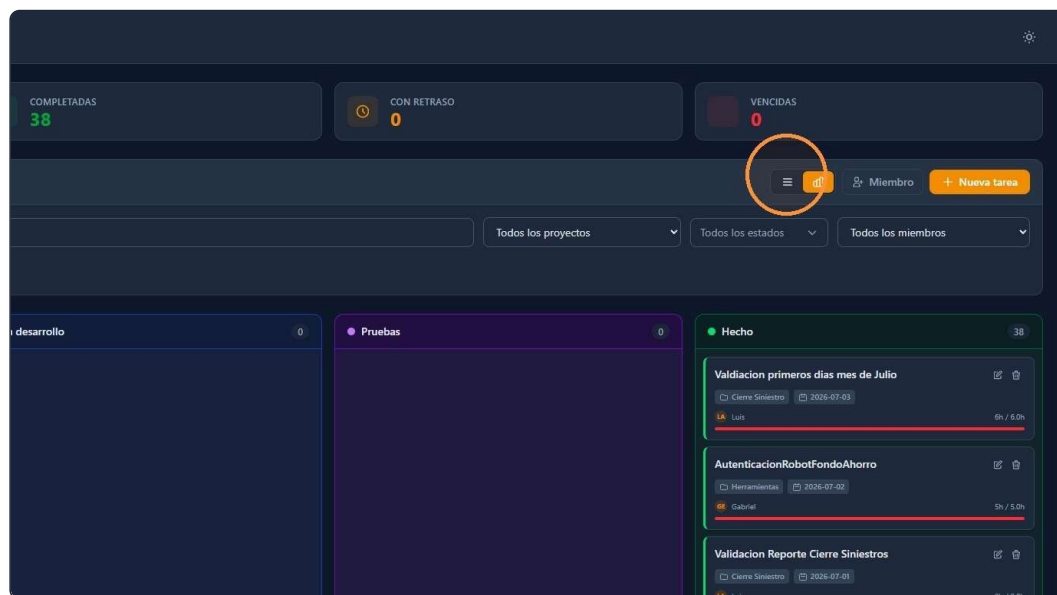

Tablero Kanban con contadores de completadas, con retraso y vencidas.


- **Nueva tarea:** se crea asignándola a un proyecto y a un miembro del equipo, con fecha de inicio/fin y horas estimadas.
- **Vista alterna tipo lista:** además del Kanban, hay una vista de lista útil cuando las tarjetas tienen descripciones largas (por ejemplo, tareas de depuración con el detalle completo del error).
- **Filtros:** por nombre, rango de fechas, proyecto, estado y miembro — permiten aislar, por ejemplo, "todo lo que tiene Luis Antonio pendiente esta semana".




Ejemplo ilustrativo del formato de tarjeta en las columnas "Pendiente" y "En desarrollo" (datos representativos).

Seguimiento fino: horas y fechas por tarea

Cada tarea guarda tres datos de horas distintos — **estimadas**, **de desarrollo** y **reales** — junto con fecha de inicio, fecha fin, proyecto, miembro asignado y estado. Esa distinción entre lo estimado y lo real es justo lo que alimenta el cálculo de retrasos y el avance que se ve en Métricas.

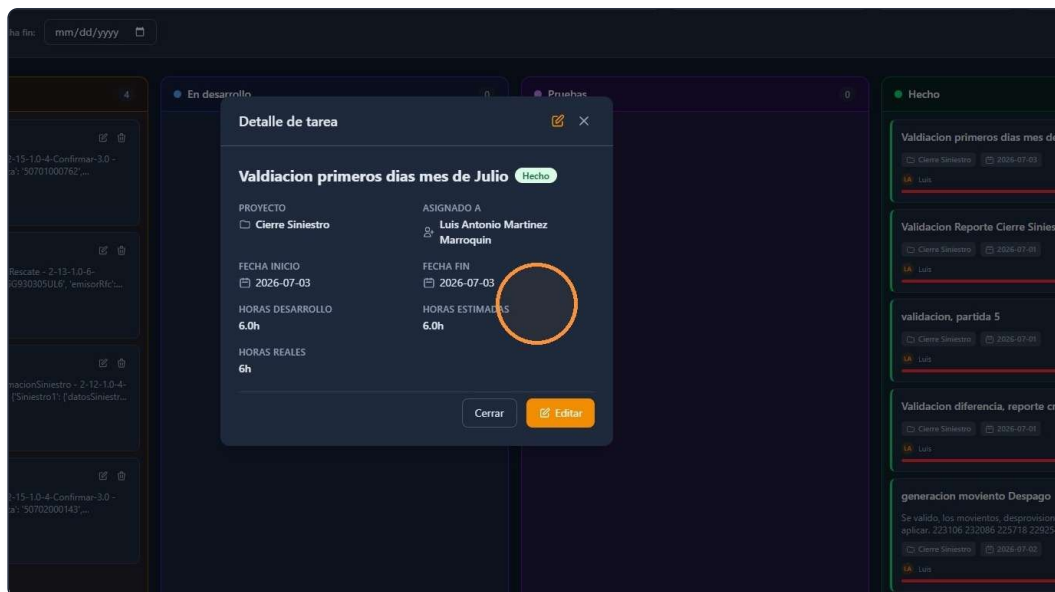


Detalle de tarea: horas estimadas vs. horas reales de desarrollo.

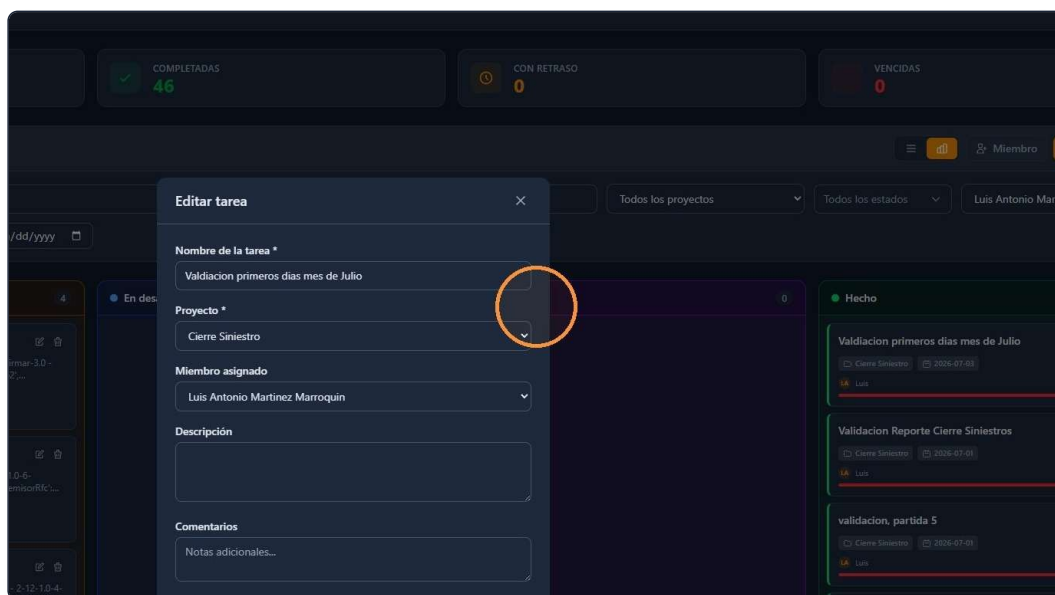

Edición de tarea: proyecto, miembro asignado, fechas, horas y estado.

Calendario


El calendario mensual muestra las tareas distribuidas por fecha de inicio/fin como bloques de color; al hacer clic en un día se despliega el detalle de las tareas programadas ahí, con el responsable y el rango de fechas. Es la vista que ayuda a visualizar carga de trabajo por semana, más allá del tablero Kanban.



Vista mensual: tareas programadas por día, codificadas por color.

El módulo para la junta gerencial

Este es el módulo que responde directamente a la necesidad original: dar un estimado de fechas y del avance a nivel gerencial. Con un clic se ve el % completado del equipo, la tasa de retraso, el total de horas estimadas y las horas extra — todo filtrable por rango de fechas, proyecto o miembro específico.

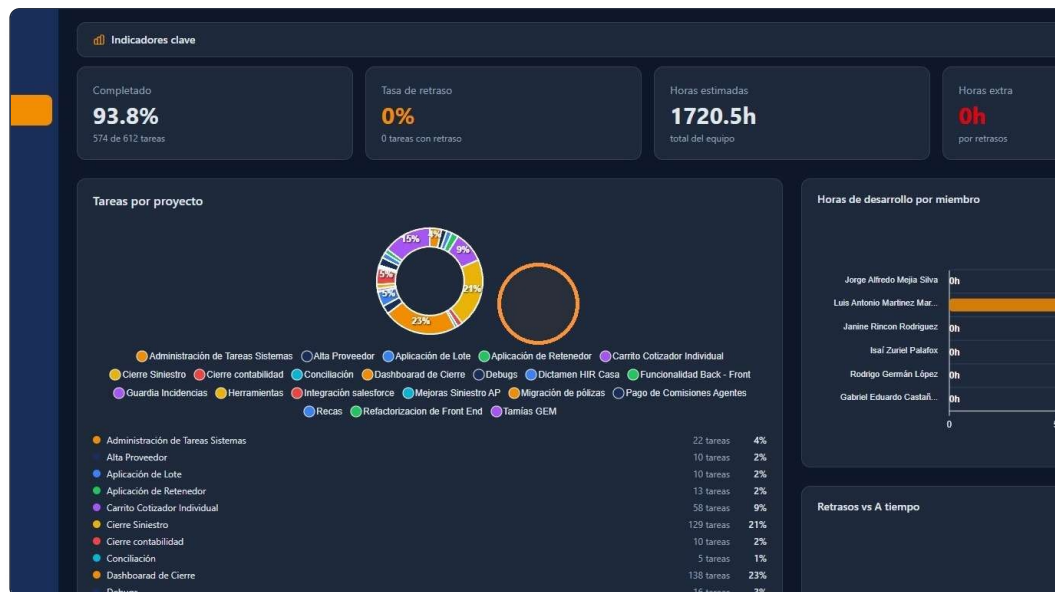

Indicadores clave: % completado, tasa de retraso, horas estimadas totales y distribución por proyecto.

Carga de trabajo por miembro


Un gráfico de barras compara horas estimadas contra horas de desarrollo reales por integrante, lo que permite detectar quién está sobrecargado o quién estima mal sus tiempos.



Horas estimadas vs. horas de desarrollo, por miembro del equipo.

Trazabilidad de cambios

"Histórico" es la bitácora de auditoría: cada cambio de estado de cada tarea queda registrado con marca de tiempo (creación de tarea, "pendiente → desarrollo", "desarrollo → pruebas", "pruebas → hecho"). Es lo que permite reconstruir, después de una junta, por qué una fecha se movió o cuándo realmente se cerró algo.

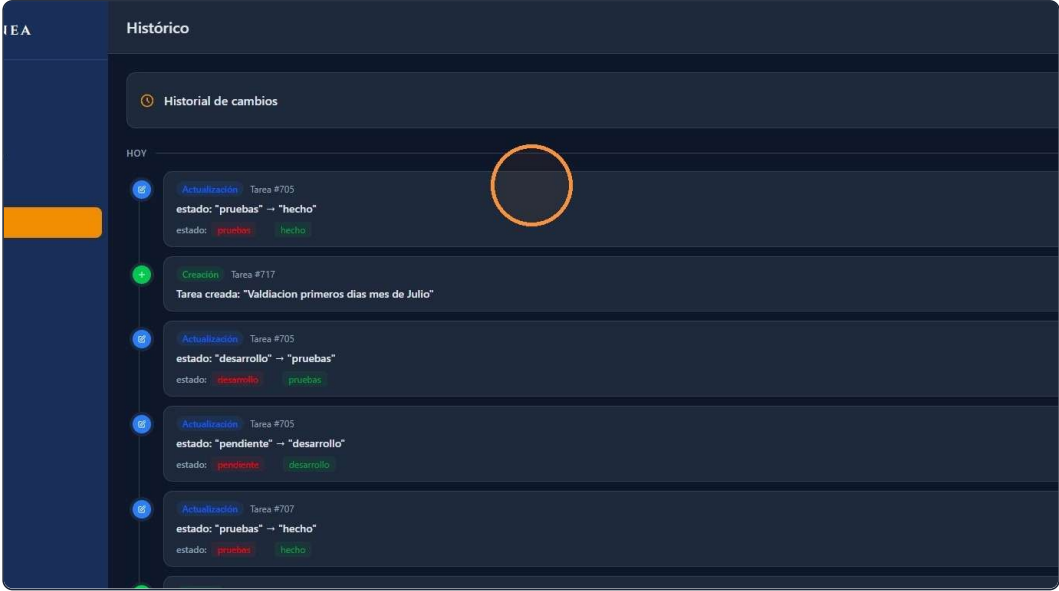

Historial de cambios: cada transición de estado, con fecha y tarea asociada.

Antes	Con Atenea
Estatus de proyectos armado manualmente para cada junta	Tarjetas de proyecto con progreso y horas en vivo
Sin forma clara de ver atrasos	Tasa de retraso e indicadores clave en Métricas
Carga de trabajo del equipo poco visible	Gráfico de horas estimadas vs. desarrolladas por miembro
Sin registro de qué cambió y cuándo	Histórico de cambios por tarea
Reporte a gerencia sin datos consolidados	Métricas filtrables por fecha, proyecto o persona
